

流域関連伊勢市公共下水道 事業計画の現状について


上下水道部下水道建設課



令和6年12月20日（金）

汚水事業計画区域図

全体計画 3,001.0ha
事業計画 2,480.4ha

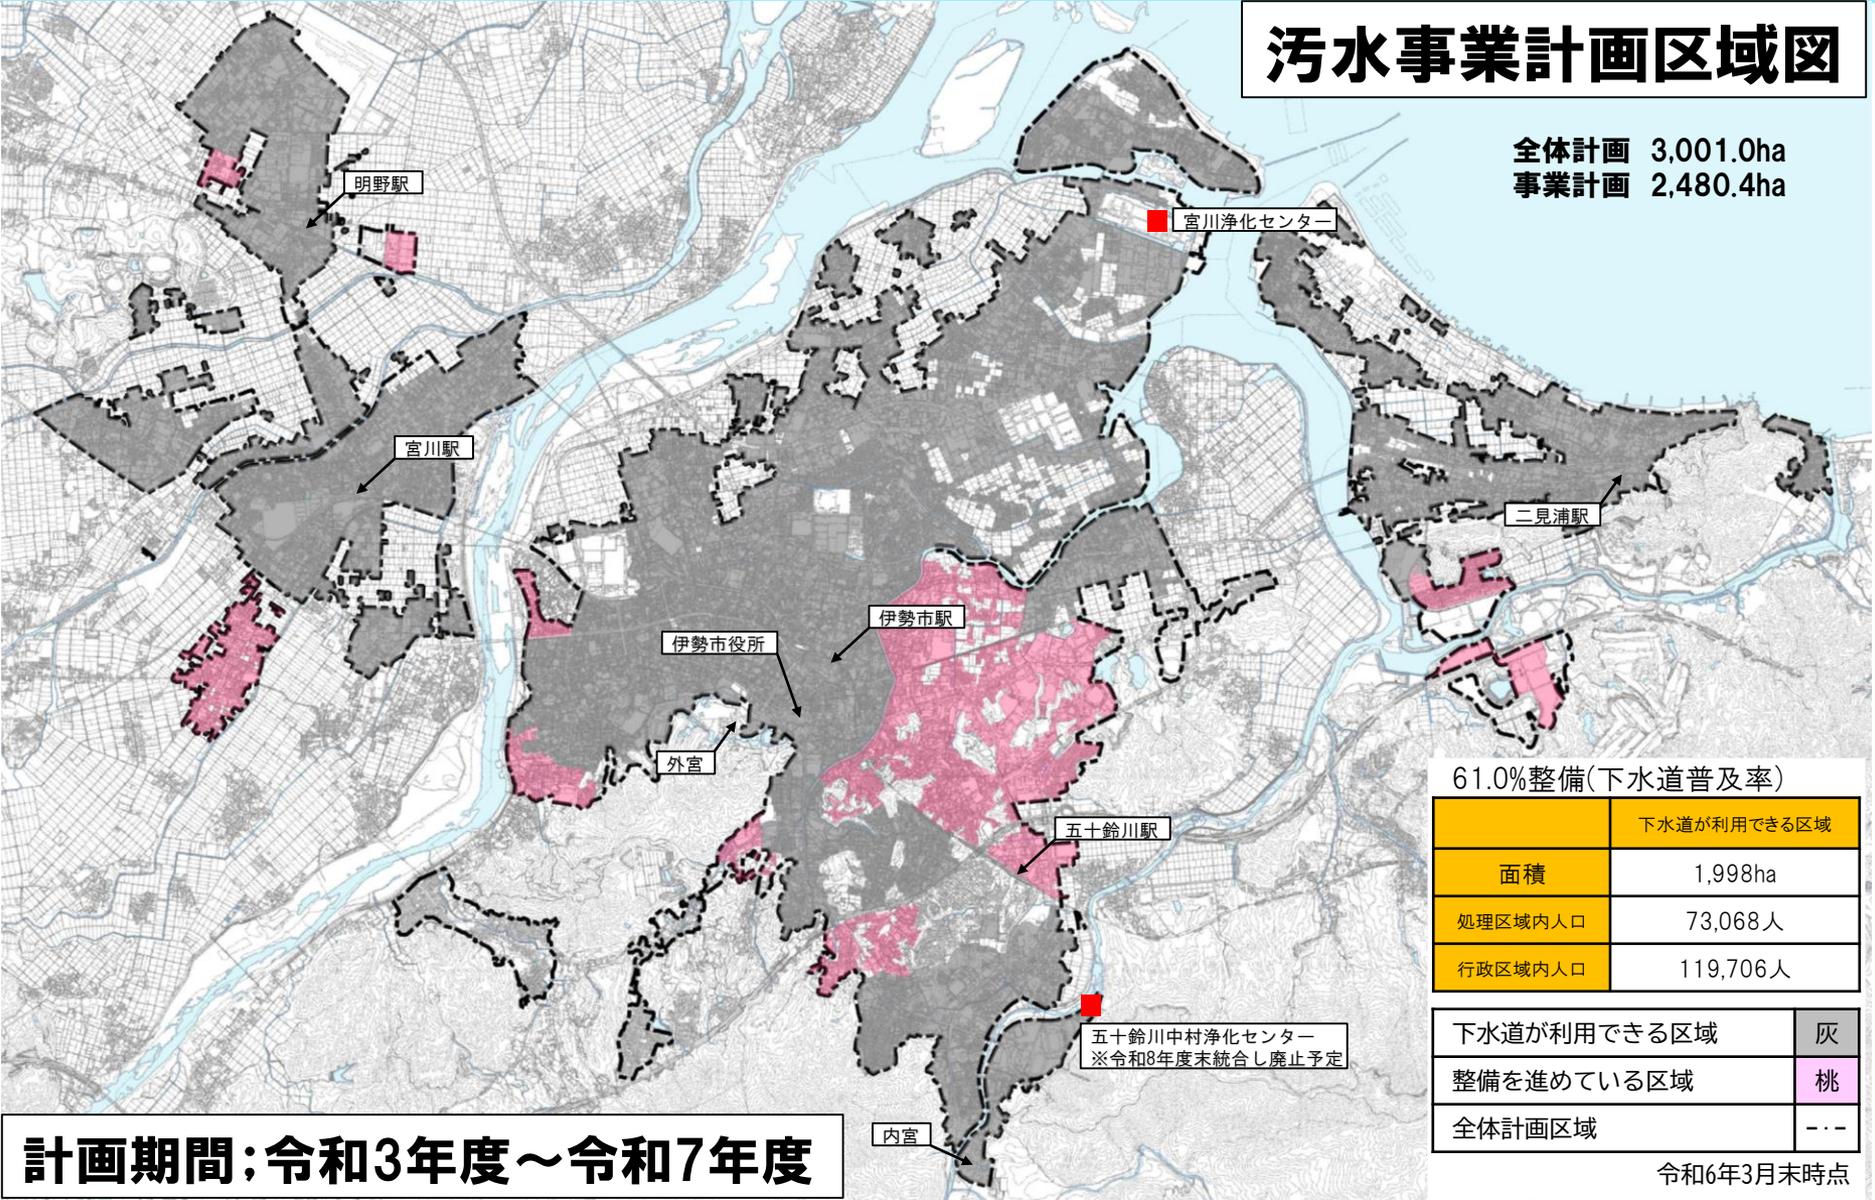

61.0%整備(下水道普及率)

	下水道が利用できる区域
面積	1,998ha
処理区域内人口	73,068人
行政区域内人口	119,706人

下水道が利用できる区域	灰
整備を進めている区域	桃
全体計画区域	---

令和6年3月末時点

計画期間: 令和3年度～令和7年度



整備計画の進捗状況

整備指標		基準値 (R03当初)	中間目標値 (R05末)	最終目標値 (R07末)
下水道処理人口 普及率 (※)	計画		62%	64%
	実績	56%	61%	—

※下水道処理人口普及率 = 下水道処理区域内人口 / 行政区域内人口 × 100

参考


汚水処理区域 整備済面積	計画		2084.6ha	2239.4ha
	実績	1921.7ha	2034.9ha	2146.0ha(見込)

第5期事業の進捗状況(参考)

		第5期事業計画
第5期事業 計画面積	計画	361.0ha(※)
	実績	54.9ha(R05末)
	残り	306.1ha

※354.6ha (第5期事業計画面積)
+6.4ha (清掃工場)


第5期事業計画の現状(令和5年度末時点)

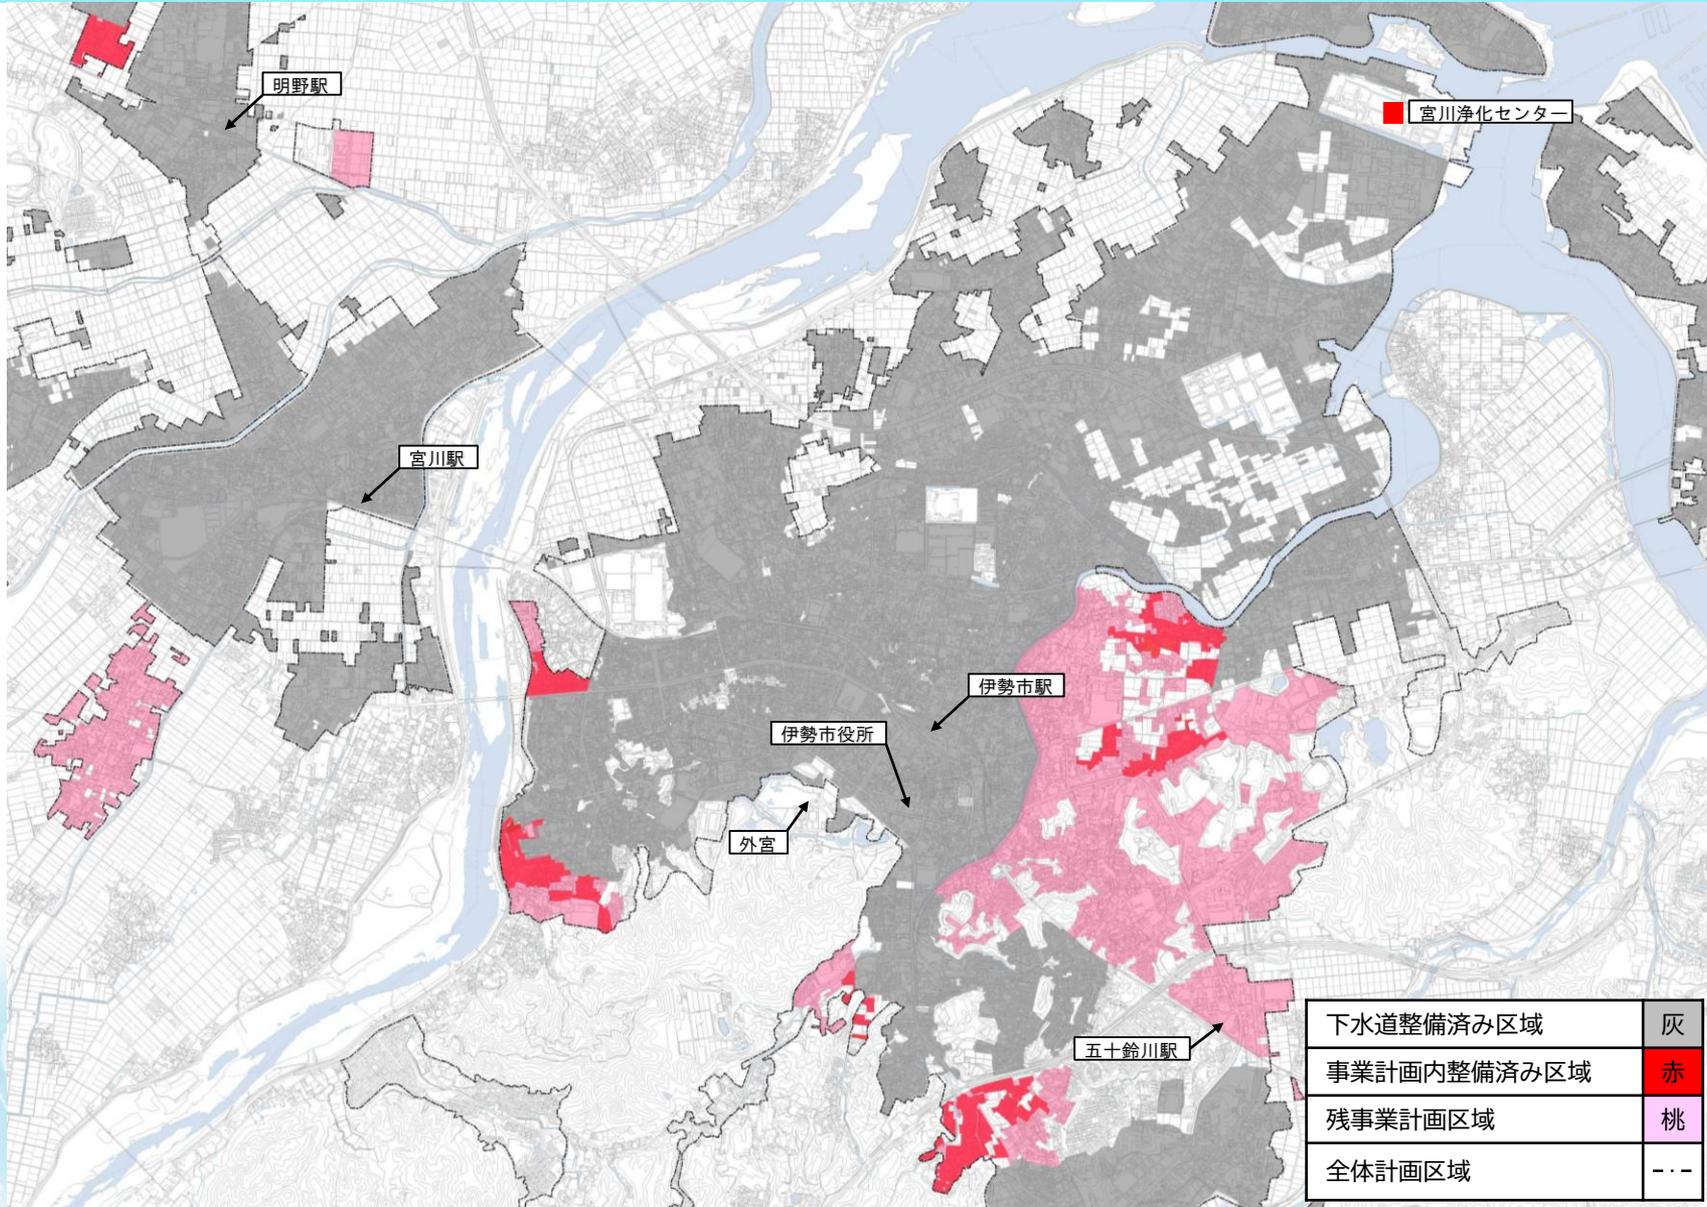




污水处理人口普及率


令和3年当初時点

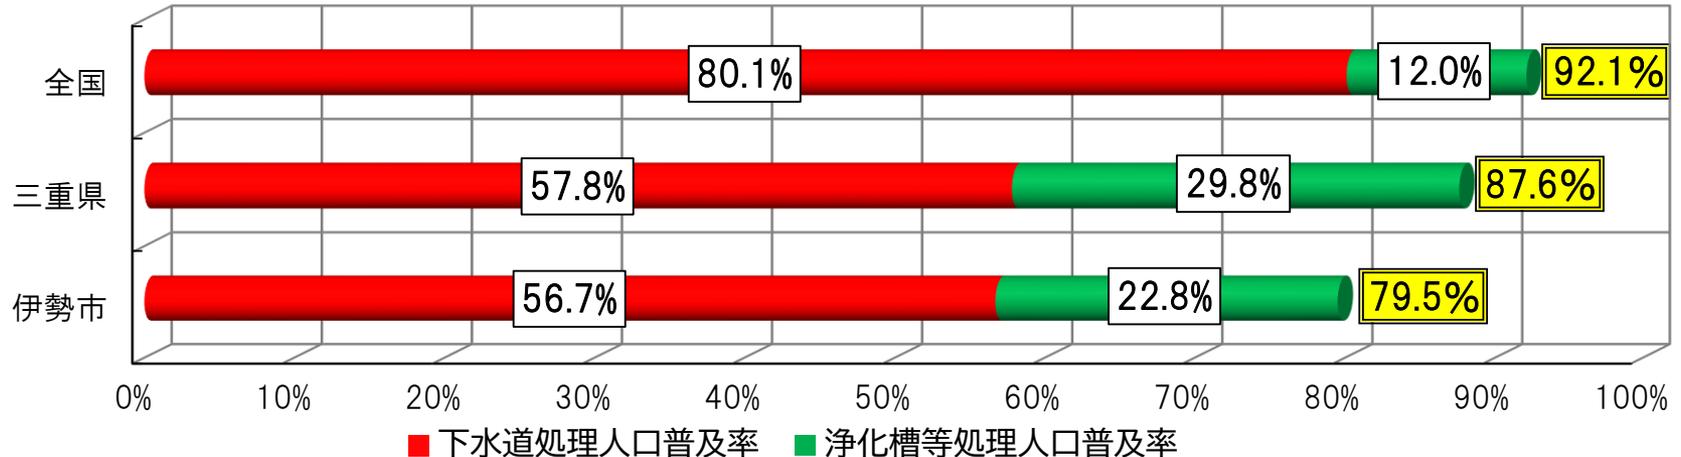

令和5年度末時点

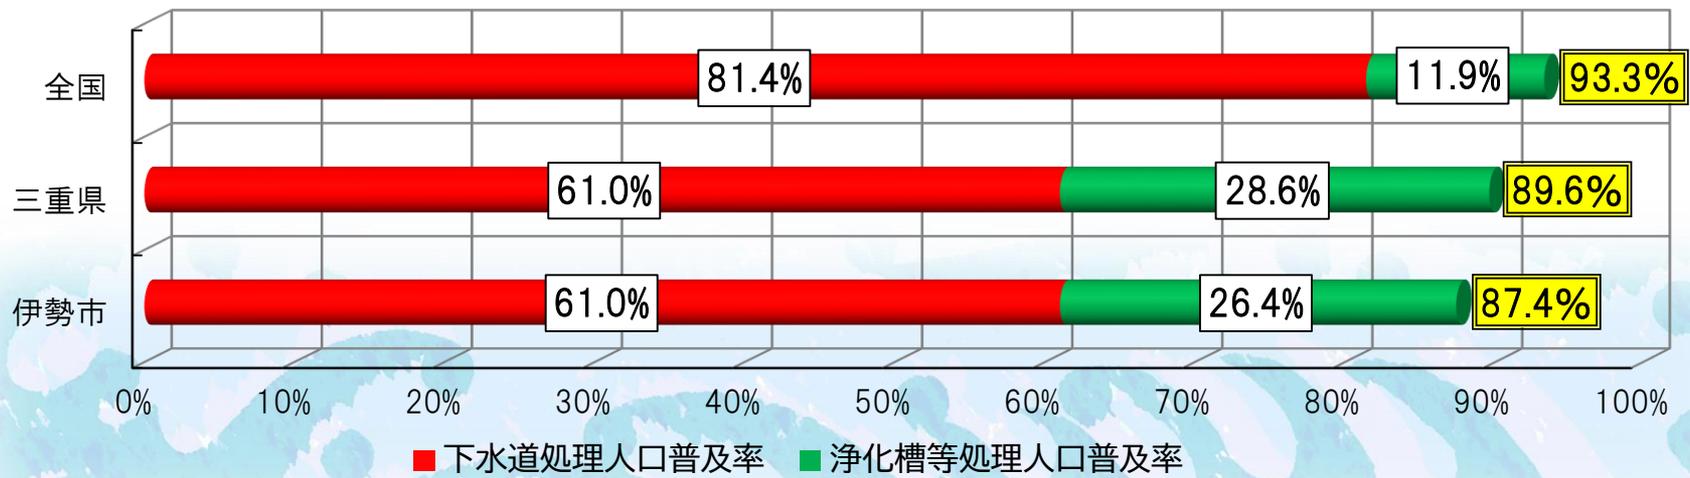

勢田川の水質変化

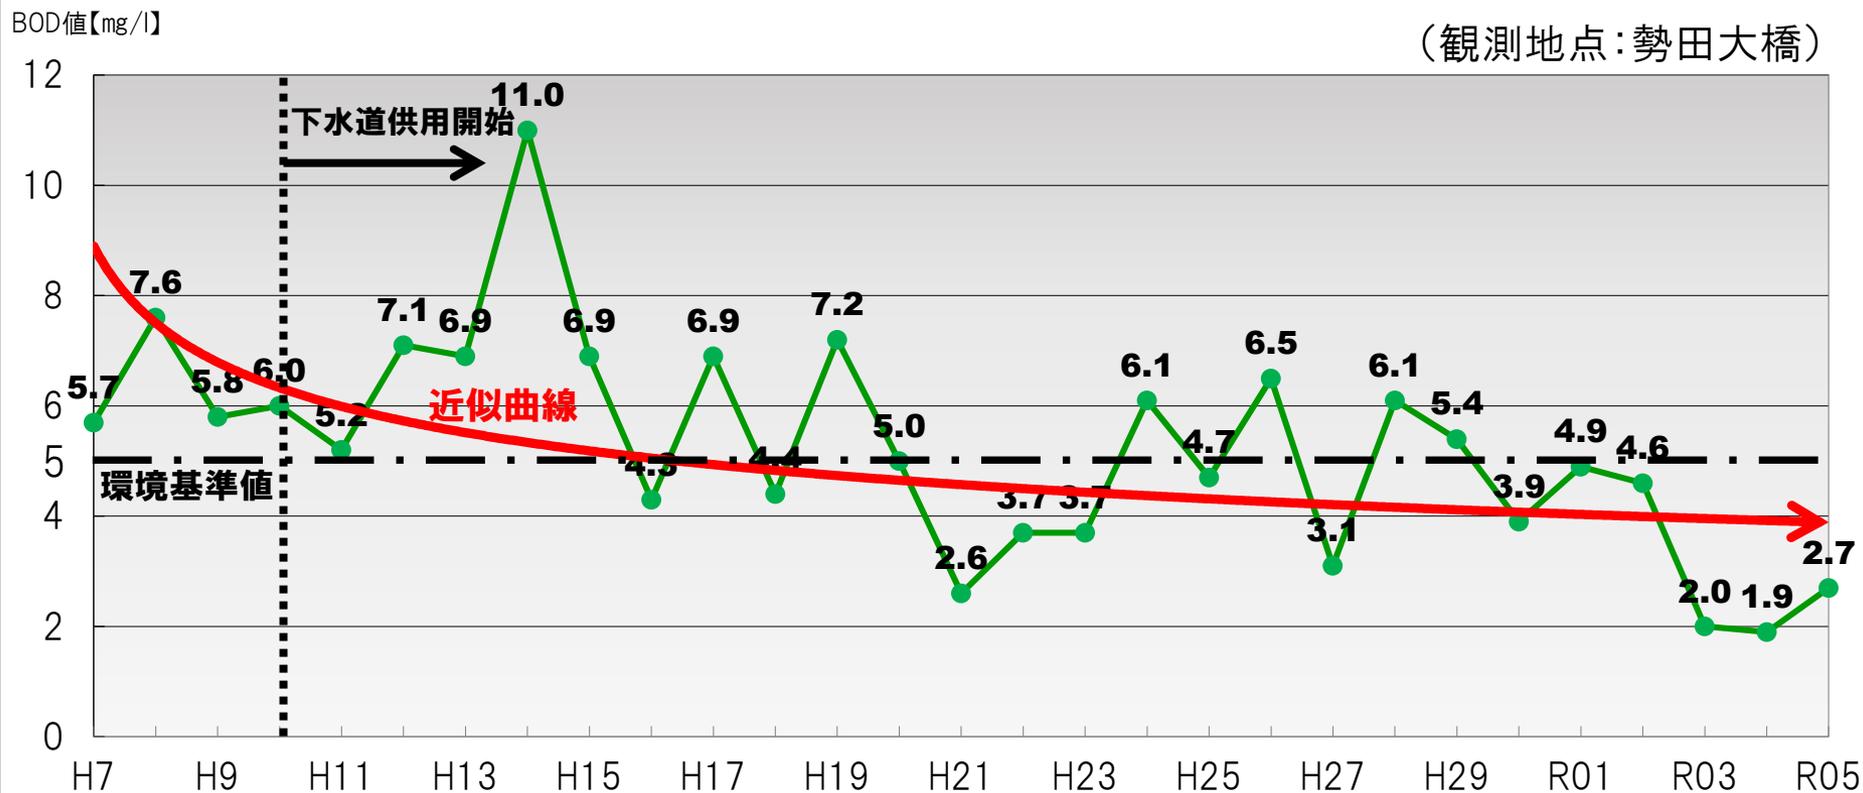

汚水処理整備の実施により、近年では勢田川の水質は環境基準値である(BOD: 5.0mg/l)を下回る傾向となりました。
